

Monitoraggio sull'andamento del Pnrr al 26 febbraio 2026

Monica Montella¹, Franco Mostacci²
(elaborazioni su dati Italia Domani – Open Data)

Sul sito [Italia Domani](#) è stato pubblicato a fine marzo il database Regis sullo stato di avanzamento del Pnrr al 26 febbraio 2026. Come noto, gli stanziamenti concessi all'Italia per il Pnrr ammontano a 194,4 miliardi (71,8 di sussidi e 122,6 di prestiti) e i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 agosto 2026, in modo da poter effettuare tutte le verifiche entro la fine del 2026.

Tra cancellazioni, definanziamenti, rifinanziamenti e nuovi investimenti, le ultime modifiche nell'allocazione delle risorse, richieste alla Commissione europea e approvate a novembre 2025, hanno riguardato più di un quarto dell'ammontare complessivo del Pnrr. Sono stati introdotti anche strumenti finanziari che consentiranno di prorogare la realizzazione di alcuni interventi dopo il 2026, per non perdere i finanziamenti. I vari aggiustamenti al piano originario, resisi necessari dalla constatazione che non era possibile rispettare le scadenze, piuttosto che dalla irrealizzabilità di alcune misure, denotano una scarsa capacità di visione e di progettazione della *governance* italiana.

Il quadro di sintesi (Tavola 1), mostra che a fronte di 191 miliardi di interventi (di cui 174 impegnati) i progetti attivi ammontano a 167,5 miliardi, a fronte dei quali sono stati effettuati pagamenti per 93 miliardi di euro, il 55,6% del totale dei progetti. Il ritmo di pagamento negli ultimi mesi ha raggiunto i 3,5 miliardi mensili. Pur essendo fortemente cresciuto negli ultimi due anni, non appare sufficiente per completare i pagamenti entro i prossimi 6 mesi. La diminuzione del numero di progetti è solo apparente ed è dovuto alla misura 'Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica' per 13,9 miliardi, raggruppati in un unico record, mentre in precedenza era possibile consultare il dettaglio (anche territoriale) degli oltre 60 mila beneficiari.

L'ammontare complessivo dei progetti avviati e in corso di realizzazione è di 167,5 miliardi, quasi 30 in meno della dotazione finanziaria complessiva. Tra le misure ancora al palo o in ritardo la misura rafforzata 4.0 vale 4,7 miliardi di euro; alla competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche mancano 3,2 miliardi di progetti; nello sviluppo del bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare il vuoto da colmare è di 2,2 miliardi; il Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare e affini attende 1,7 miliardi; lo strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) 1,4 miliardi; lo sviluppo dell'agrovoltaico 1,1 miliardi; il credito d'imposta di Transizione 5.0 1,1 miliardi; il rafforzamento dell'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia oltre un miliardo; il regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche (FNISSI) 1 miliardo (Tavola 2).

Tra le 7 missioni in cui si articola il Pnrr, quella con il maggior stanziamento è 'M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica' con 56,8 miliardi, di cui 11 non si traducono ancora in progetti. Anche 'M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura', con 43,3 miliardi stanziati e 35,7 attivati, presenta un deficit di progetti per quasi 8 miliardi, ma è l'unica con oltre il 70% di pagamenti effettuati (Tavola 3).

Tra i soggetti titolari il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha una maggiore dotazioni di fondi su progetti attivati (38,2 miliardi), di cui la metà pagati. Va meglio al Ministero dell'Ambiente e

¹ Ricercatrice senior in campo economico e di contabilità nazionale presso l'Istat (il lavoro riflette solo l'opinione dell'autrice e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza).

² Ricercatore senior in campo statistico-economico e giornalista pubblicitista.

sicurezza energetica con due terzi dei 25,5 miliardi progetti in essere e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove è già stato pagato l'80% dei 20,8 miliardi complessivi (Tavola 4).

Il 4,5% dei progetti (7,5 miliardi di euro) è ancora in una fase preliminare che precede l'esecuzione, il 32,3% è stato completato (54 miliardi), il 56,4% è in corso di esecuzione (94 miliardi), mentre il 6,9% (11,5 miliardi) doveva già essere terminato ma è in ritardo (Tavola 5). Nella precedente ricognizione del 14 ottobre 2025 il ritardo nell'esecuzione dei progetti era al 6,2% (Figura 2).

Relativamente al mancato avvio dell'esecuzione risulta sostanzialmente al palo il [Fondo Rotativo Contratti di Filiera \(FCF\)](#) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e affini per 2,3 miliardi di euro, in cui è stato di recente prorogato il termine per la presentazione di domande di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati; il progetto [Tyrrenian link](#) (500 milioni di euro); il rafforzamento delle smart grid (391 milioni più altri 385 della misura rafforzata su 4 miliardi complessivi); il collegamento ferroviario Palermo-Catania ad alta velocità per passeggeri e merci (507 milioni su 1,2 miliardi); il piano Asili nido e scuole dell'infanzia (197 milioni su 4,3 miliardi) e numerosi altri (Tavola 6).

Le missioni con i maggiori ritardi nel completamento dell'esecuzione (Tavola 7) sono M5 – Inclusione e coesione (16,8%); M6 - Salute (16%); M3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile (8,5%) e M4 - Istruzione e Ricerca (6,7%).

Tra le misure, ritardi nel completamento dell'esecuzione si riscontrano nel 'Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali' (1,9 miliardi di euro su 6,5 totali); la 'Casa come primo luogo di cura (Adi)' (1,4 miliardi su 2,8); le politiche attive sul lavoro e formazione professionale (1,4 miliardi su 3,6); il 'Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia' (809 milioni su 4,4 miliardi); il 'Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica' (809 milioni su 5 miliardi); la digitalizzazione degli ospedali (356 milioni su 2,8 miliardi) e molti altri (Tavola 8).

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è il soggetto titolare che registrerebbe in assoluto il maggior ritardo nella fase di esecuzione con 2,7 miliardi di euro su 38,2 complessivi e a seguire il Ministero della salute (2,4 miliardi su quasi 15) e quello dell'istruzione e del merito (2 miliardi su 17,4) (tavola 9).

Tra i soggetti attuatori Rete Ferroviaria Italiana ha accumulato ritardi per quasi 2 miliardi di euro su 22 complessivi, con le Regioni - Lombardia e Campania su tutte – in grave difficoltà nel completamento dei progetti relativi alla Sanità (Tavola 10).

Osservando i progetti del Pnrr per ambito territoriale regionale, ritardi a doppia cifra si registrano in Trentino Alto Adige (15,7%), Lombardia (12,7%), Campania (12,1%), Abruzzo (11,6%) e Calabria (10,7%), a fronte di una media regionale del 8,9%, con il Nord in maggiore ritardo (Tavola 11).

Tra i Comuni, il territorio di Roma Capitale usufruisce dei maggiori finanziamenti per oltre 7 miliardi, con progetti in ritardo di esecuzione per 414 milioni (Tavola 12).

Risulta collaudato il 25,6% dei progetti (era il 22,2% al 14 ottobre 2025) per quasi 43 miliardi di euro, mentre il 2,6% (4,3 miliardi) doveva già essere terminato ma è in ritardo (Tavola 13). Se si considera il sottoinsieme di progetti la cui esecuzione è conclusa (54 miliardi), per il 10% di essi il collaudo deve ancora iniziare, per il 79% è terminato, per il 10% è in corso di effettuazione e nel restante 1,4% è in ritardo.

L'ammontare dei pagamenti risente dello stato di esecuzione e completamento dei progetti (Tavola 14). Come detto la percentuale dei pagamenti al 26 febbraio 2026 ha raggiunto il 56% dell'ammontare dei progetti avviati, ma sfiora il 90% quando il collaudo è completato, mentre è solo il 37% se ancora deve iniziare.

Tavola 1 - Prospetto riassuntivo

	04-dic-23	19-lug-24	13-dic-24	31-mar-25	30-giu-25	14-ott-25	26-feb-26
Numero progetti	229.021	256.686	269.299	284.066	298.339	306.346	280.169
Numero progetti localizzati			321.062	336.918	351.674	359.433	335.629
Importo procedure (programmazione)	174.181.114.252	184.382.374.368	189.840.114.517	192.293.824.820	192.534.201.735	191.042.901.195	
Importo impegnato (programmazione)	157.665.985.683	162.087.043.422	163.993.121.057	163.348.415.554	172.656.707.469	174.501.983.847	
Ammontare progetti (euro)	123.231.556.788	136.520.204.116	140.356.168.667	157.389.326.390	159.101.507.292	162.817.664.554	167.506.366.218
Ammontare pagamenti (euro)	45.653.018.261	51.349.894.169	58.604.447.711	64.371.044.768	69.802.506.920	77.079.266.745	93.119.046.561
Percentuale di pagamento	37,0	37,6	41,8	40,9	43,9	47,3	55,6
Ritmo di pagamento mensile (euro)		749.588.935	1.480.521.131	1.601.832.516	1.790.591.918	1.935.262.230	3.564.395.515

Tavola 2 – Principali differenze tra stanziamenti e ammontare dei progetti attivati al 26 febbraio 2026 per misura (euro)

Identificativo	MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	Finanziamento	INTERVENTO	Stanziamento	Progetti	Differenza
M1C2-I01.09.00	M1	M1C2	Investimento	Prestito	Misura rafforzata: Transizione 4.0	4.700.000.000	0	4.700.000.000
M2C2I5.01.B1	M2	M2C2	Sub-Investimer	Prestito	Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche	3.200.000.000	0	3.200.000.000
M2C2-I01.04.00	M2	M2C2	Investimento	Prestito	Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	2.236.020.000	2.016.000	2.234.004.000
M2C1-I03.04.00	M2	M2C1	Investimento	Prestito	Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei set	4.000.000.000	2.296.089.961	1.703.910.039
M7C1-I17.00.00	M7	M7C1	Investimento	Prestito	Strumento finanziario per l'efficiamento energetico dell'edilizia residenziale pubb	1.381.000.000	0	1.381.000.000
M2C2-I01.01.00	M2	M2C2	Investimento	Prestito	Sviluppo agro-voltaico	1.099.000.000	0	1.099.000.000
M7C1I15.1.01	M7	M7C1	Investimento	Prestito	Transizione 5.0 - Credito d'imposta	2.459.044.600	1.402.727.618	1.056.316.982
M3C1-R01.03.01	M3	M3C1	Riforma	Prestito	Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia	1.201.276.911	157.670.235	1.043.606.676
M2C4-I04.05.00	M2	M2C4	Investimento	Prestito	Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche (FNISSI)	1.000.000.000	0	1.000.000.000
M5C1-R01.01.00	M5	M5C1	Riforma	Sovvenzic	ALMPs e formazione professionale	4.577.838.882	3.598.705.452	979.133.430
M2C2-I01.02.00	M2	M2C2	Investimento	Prestito	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	795.500.000	0	795.500.000
M2C1-I04.01.00	M2	M2C1	Investimento	Prestito	Dispositivo per il parco agrisolare	789.000.000	0	789.000.000
M1C2-I01.07.00	M1	M1C2	Investimento	Prestito	Fondo nazionale Connettività	733.402.818	0	733.402.818
M5C3-I04.00.02	M5	M5C3	Sub-Investimer	Prestito	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Ana:	625.466.044	6.000.000	619.466.044
M5C1-I02.01.00	M5	M5C1	Investimento	Sovvenzic	Servizio civile universale	950.000.000	431.281.960	518.718.040
M6C1-I01.02.03	M6	M6C1	Sub-Investimer	Prestito	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.500.000.000	998.702.696	501.297.304
M1C2-I01.08.00	M1	M1C2	Investimento	Prestito	Comparto degli Stati membri di InvestEU	500.000.000	0	500.000.000
M5C3-I05.00.00	M5	M5C3	Investimento	Prestito	Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona E	500.000.000	0	500.000.000
M2C2-I04.05.01	M2	M2C2	Investimento	Sovvenzic	Programma di rinnovo della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli	457.320.000	0	457.320.000
M2C1-I01.01.00	M2	M2C1	Investimento	Prestito	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esiste	1.764.000.000	1.373.931.523	390.068.477
M2C2-I04.04.01	M2	M2C2	Sub-Investimer	Sovvenzic	Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a	2.415.000.000	2.096.510.825	318.489.175
M4C1-I01.05.00	M4	M4C1	Investimento	Sovvenzic	Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000	1.190.086.658	309.913.342
M1C2-I01.05.01	M1	M1C2	Sub-Investimer	Prestito	Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	1.200.000.000	893.729.969	306.270.031

Tavola 3 - Prospetto riassuntivo per missione al 26 febbraio 2026 (euro)

Missione	Stanziamenti	Progetti	Pagamenti	% Pagam.
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	43.304.794.132	35.702.629.745	25.451.306.643	71,3
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	56.819.716.421	45.735.517.817	26.407.114.800	57,7
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	24.946.699.412	23.296.637.691	11.782.032.617	50,6
M4 - Istruzione e ricerca	30.255.620.295	29.773.324.204	14.227.207.283	47,8
M5 - Inclusione e coesione	16.270.819.822	13.847.205.381	6.516.341.139	47,1
M6 - Salute	15.625.541.084	14.856.632.053	6.847.208.837	46,1
M7 - RePower EU	7.212.200.000	4.294.419.327	1.887.835.242	44,0
Totale complessivo	194.435.391.164	167.506.366.218	93.119.046.561	55,6

Figura 1 - Evoluzione dei Pagamenti (euro)

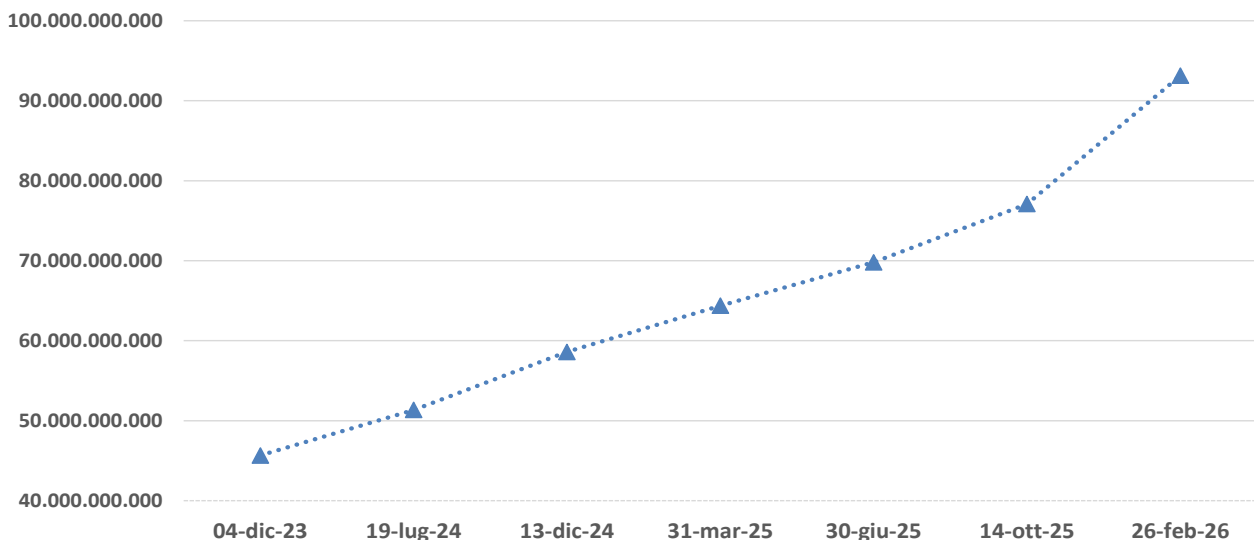


Tavola 4 - Pagamenti per soggetto titolare al 26 febbraio 2026 (euro)

Soggetto titolare	Finanziamento	Pagamento	% Pagamento
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	38.242.603.261	19.014.166.568	49,7
MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	25.454.566.274	17.208.497.223	67,6
MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	20.819.451.535	16.664.760.639	80,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	17.419.451.609	7.711.065.588	44,3
MINISTERO DELLA SALUTE	14.856.632.053	6.847.208.837	46,1
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.108.651.222	6.481.338.187	58,3
PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	10.329.869.279	5.827.183.655	56,4
MINISTERO AGRICOLTURA SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	6.364.324.406	1.768.378.643	27,8
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	6.120.987.029	2.014.200.140	32,9
MINISTERO DELLA CULTURA	3.976.280.511	1.534.378.803	38,6
MINISTERO DELL'INTERNO	3.572.204.980	2.322.392.248	65,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.715.789.054	2.047.116.794	75,4
MINISTERO DEL TURISMO	1.518.100.070	693.184.041	45,7
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	1.162.640.968	735.377.932	63,3
MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT	893.729.969	614.623.540	68,8
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	868.052.270	374.434.309	43,1
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	699.653.816	415.691.210	59,4
PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS	431.281.960	460.705.962	106,8
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	292.500.000	180.058.629	61,6
PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE	288.328.013	27.915.283	9,7
PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	194.925.081	81.173.653	41,6
PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	125.770.844	57.994.591	46,1
GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAR)	41.800.000	33.755.296	80,8
PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA	8.772.014	3.444.790	39,3
Totale complessivo	167.506.366.218	93.119.046.561	55,6

Tavola 5 - Stato dell'esecuzione dei progetti per fase al 26 febbraio 2026 (euro)

		Completamento				Totale	
		Fase antecedente	Terminata	Successiva	Ritardo		
I n i z i o	Fase antecedente	7.454.295.248				7.454.295.248	4,5
	Iniziata		54.038.939.548	90.839.924.333	10.601.525.627	155.480.389.507	92,8
	Successiva			1.390.337.793		1.390.337.793	0,8
	Ritardo			2.263.755.350	917.588.320	3.181.343.670	1,9
Totale		7.454.295.248	54.038.939.548	94.494.017.475	11.519.113.946	167.506.366.218	
		4,5	32,3	56,4	6,9		

Figura 2 - Completamento dell'esecuzione dei progetti per fase (euro)

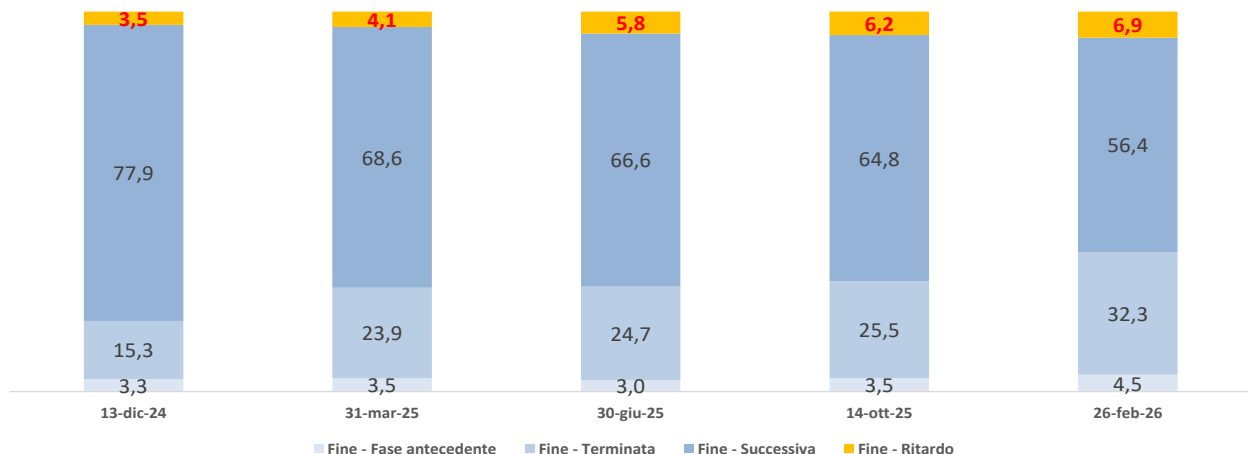


Tavola 6 - Mancato avvio dell'esecuzione dei progetti per missioni e principali submisure al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Submisura	Descrizione	Nr. progetti	Mancato avvio	Totale	%
M1C11.01.00	Infrastrutture digitali	7	87.838.951	720.447.020	12,2
M1C312.04.00	Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricolto	83	59.823.278	775.329.339	7,7
M1C11.04.04	Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANAGRAFE)	1	17.596.150	279.034.770	6,3
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura					
		254	188.259.890	35.702.629.745	0,5
M2C113.04.00	Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquicoltura	1.371	2.256.089.961	2.296.089.961	98,3
M2C212.01.00	Rafforzamento smart grid	29	390.608.451	3.666.843.559	10,7
M2C215.02.00	Idrogeno	4	254.005.000	256.806.450	98,9
M2C413.04.00	Bonifica del suolo dei siti orfani	23	162.108.353	498.722.379	32,5
M2C112.02.00	Parco Agrisolare	1.102	106.073.907	2.315.875.003	4,6
M2C213.01.00	Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	11	94.490.573	508.626.608	18,6
M2C414.01.00	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	3	71.521.067	1.927.580.877	3,7
M2C213.05.01	Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans)	25	66.741.840	259.728.490	25,7
M2C414.04.00	Investimenti in fognatura e depurazione	21	47.074.047	584.569.554	8,1
M2C212.02.00	Interventi su resilienza climatica delle reti	3	17.550.600	553.706.045	3,2
M2C112.03.00	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	324	15.822.982	300.122.703	5,3
M2C111.01.00	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	8	13.413.213	1.373.931.523	1,0
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica					
		3.161	3.545.231.922	45.735.517.817	7,8
M3C111.01.02	Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	1	507.637.298	1.229.878.279	41,3
M3C212.03.00	Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto	3	78.261.974	305.590.639	25,6
M3C211.01.00	Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	33	68.737.330	157.670.235	43,6
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile					
		51	701.718.987	23.296.637.691	3,0
M4C111.01.00	Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	276	197.312.208	4.384.236.845	4,5
M4C111.02.00	Piano di estensione del tempo pieno	181	77.396.954	954.723.853	8,1
M4C111.04.00	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	430	40.560.142	1.263.904.110	3,2
M4C113.03.00	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	33	35.429.109	4.906.806.743	0,7
M4C112.01.00	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	170	10.068.697	527.591.130	1,9
M4 - Istruzione e ricerca					
		1.170	374.919.207	29.773.324.204	1,3
M5C111.01.00	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	108	92.077.764	518.307.308	17,8
M5C111.04.00	Sistema duale	491	47.621.734	592.725.057	8,0
M5C213.01.00	Progetto Sport e inclusione sociale	14	13.137.177	699.653.816	1,9
M5C311.03.00	Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore	56	12.937.390	177.337.708	7,3
M5 - Inclusione e coesione					
		4.921	859.458.960	13.847.205.381	6,2
M6C211.01.01	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	84	153.194.844	2.829.552.905	5,4
M6C111.02.03	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	23	142.813.945	998.702.696	14,3
M6C211.02.00	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	19	47.800.860	887.394.795	5,4
M6C211.03.01	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la gestione delle informazioni	55	20.305.801	1.333.042.106	1,5
M6C111.01.00	Case della Comunità e presa in carico della persona	21	16.864.481	1.999.953.093	0,8
M6C212.01.00	Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	76	16.618.595	522.551.004	3,2
M6C211.03.02	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la gestione delle informazioni	8	13.093.206	278.737.077	4,7
M6 - Salute					
		365	427.870.551	14.856.632.053	2,9
M7C1104.1.00	Tyrrhenian link	3	500.000.000	500.000.000	100,0
M7C1101.1.00	Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	20	385.166.440	393.156.440	98,0
M7C1105.1.00	SA.CO.I.3	2	200.000.000	200.000.000	100,0
M7C1107.1.00	Rete di trasmissione intelligente	4	140.000.000	140.000.000	100,0
M7C1110.1.00	Progetti pilota sulle competenze Crescere Green	193	84.082.705	96.617.326	87,0
M7C1111.1.00	Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni	2	37.411.587	922.509.693	4,1
M7 - RePower EU					
		225	1.356.835.732	4.294.419.327	31,6
Totale complessivo		10.147	7.454.295.248	167.506.366.218	4,5

Tavola 7 - Completamento nell'esecuzione dei progetti per Missione al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Missione	Fase antecedente	Esecuzione terminata	Fine programmata	Ritardo esecuzione	Totale	% Ritardo
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	Progetti	254	69.663	28.302	15.077	113.296
	Importo	188.259.890	17.732.242.252	16.694.741.695	1.087.385.908	35.702.629.745
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	Progetti	3.161	17.897	20.638	5.297	46.993
	Importo	3.545.231.922	18.564.679.920	21.963.448.658	1.662.157.318	45.735.517.817
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	Progetti	51	61	368	80	560
	Importo	701.718.987	900.435.326	19.709.676.163	1.984.807.215	23.296.637.691
M4 - Istruzione e ricerca	Progetti	1.170	57.921	28.027	4.352	91.470
	Importo	374.919.207	8.802.794.476	18.592.071.239	2.003.539.281	29.773.324.204
M5 - Inclusione e coesione	Progetti	4.921	28.337	27.653	3.772	64.683
	Importo	859.458.960	2.400.847.066	8.267.475.403	2.319.423.952	13.847.205.381
M6 - Salute	Progetti	365	5.421	4.155	718	10.659
	Importo	427.870.551	3.947.490.856	8.103.970.374	2.377.300.273	14.856.632.053
M7 - RePower EU	Progetti	225	7.719	23	1	7.968
	Importo	1.356.835.732	1.690.449.652	1.162.633.943	84.500.000	4.294.419.327
Totale	Progetti	10.147	187.019	109.166	29.297	335.629
	Importo	7.454.295.248	54.038.939.548	94.494.017.475	11.519.113.946	167.506.366.218

Figura 3 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per Missione (valori percentuali)

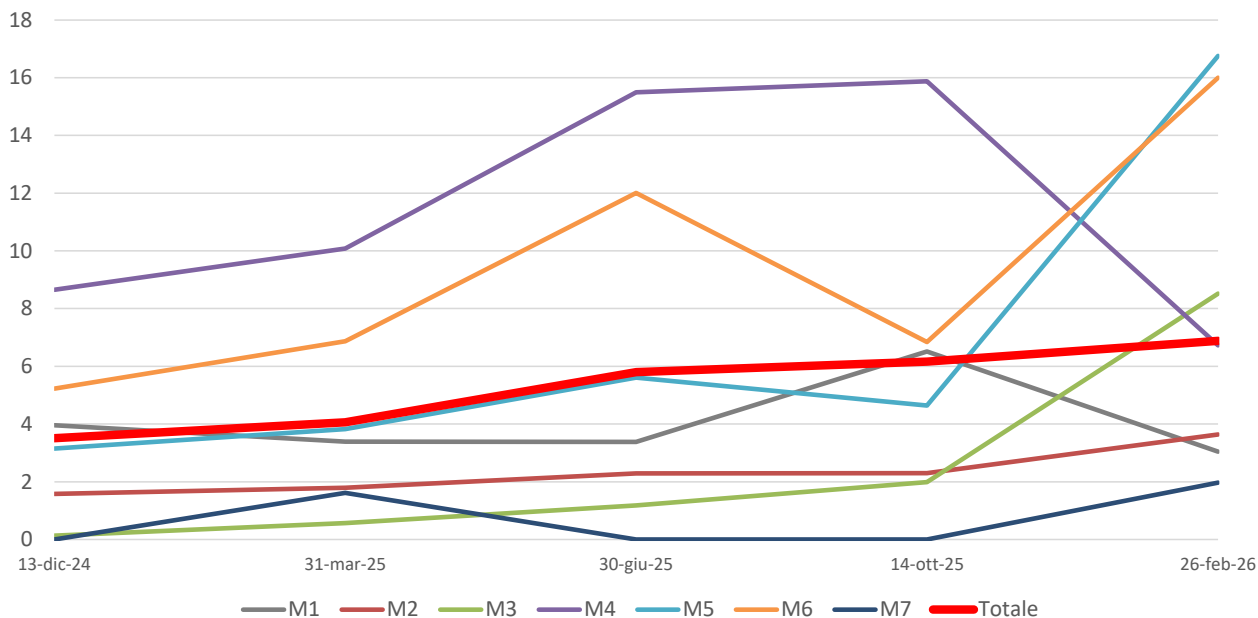


Tavola 8 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per missioni e principali submisure al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Submisura	Descrizione	Nr. progetti	Ritardo	Totale	%
M1C3I2.02.00	Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	2.118	263.245.530	449.891.076	58,5
M1C3I2.01.00	Attrattività dei borghi	2.985	249.703.754	992.437.369	25,2
M1C3I1.01.05	Digitalizzazione	17	139.300.954	200.000.000	69,7
M1C3I3.03.02	Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	1.567	91.886.002	103.731.307	88,6
M1C3I2.04.00	Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le	61	64.325.090	775.329.339	8,3
M1C1I2.02.03	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	3.889	63.719.863	203.534.658	31,3
M1C2I5.01.01	Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	204	42.608.800	893.729.969	4,8
M1C3I1.02.00	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipaz	99	26.401.495	299.831.519	8,8
M1C1I1.02.00	Abilitazione al cloud per le PA locali	274	25.919.364	969.701.609	2,7
M1C3I3.03.04	Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	323	17.685.679	19.798.978	89,3
M1C3I1.01.02	Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	1	16.000.000	16.000.000	100,0
.....					
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura		15.077	1.087.385.908	35.702.629.745	3,0
M2C1I2.02.00	Parco Agrisolare	2.217	337.038.862	2.315.875.003	14,6
M2C4I4.03.00	Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	39	178.980.881	885.207.372	20,2
M2C1I1.01.00	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	230	160.864.211	1.373.931.523	11,7
M2C2I3.05.01	Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans)	38	140.082.338	259.728.490	53,9
M2C4I4.02.00	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	60	121.493.666	1.888.797.652	6,4
M2C4I4.01.00	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	29	106.510.051	1.927.580.877	5,5
M2C3I1.01.00	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	18	86.177.525	1.156.489.481	7,5
M2C4I3.02.01	Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e	1	82.000.000	82.000.000	100,0
M2C4I4.04.00	Investimenti in fognatura e depurazione	18	76.069.437	584.569.554	13,0
M2C1I2.03.00	Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	2.089	70.069.923	300.122.703	23,3
M2C4I3.04.00	Bonifica del suolo dei siti orfani	10	45.121.268	498.722.379	9,0
M2C4I2.01.02	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	78	43.951.334	1.162.640.968	3,8
.....					
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica		5.297	1.662.157.318	45.735.517.817	3,6
M3C1I1.10.00	Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali	55	1.862.973.180	6.530.936.818	28,5
M3C1I1.04.00	Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	3	64.574.308	2.466.000.000	2,6
M3C2I1.01.00	Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	16	22.993.844	157.670.235	14,6
M3C1I1.08.00	Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	2	22.145.606	338.474.851	6,5
.....					
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile		80	1.984.807.215	23.296.637.691	8,5
M4C1I1.01.00	Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	637	809.818.700	4.384.236.845	18,5
M4C1I3.03.00	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	489	809.002.010	4.906.806.743	16,5
M4C1I1.02.00	Piano di estensione del tempo pieno	303	143.082.656	954.723.853	15,0
M4C1I1.05.00	Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	17	54.377.590	1.190.086.658	4,6
M4C1I1.03.00	Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	61	49.892.739	310.188.440	16,1
M4C1I1.04.00	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grad	335	37.827.110	1.263.904.110	3,0
M4C1I2.01.00	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	1.919	33.226.621	527.591.130	6,3
M4C2I3.01.00	Investimento 3.1 - Infrastrutture di ricerca e innovazione	5	31.630.725	1.481.273.896	2,1
.....					
M4 - Istruzione e ricerca		4.352	2.003.539.281	29.773.324.204	6,7
M5C1R1.01.00	ALMPs e formazione professionale	1.605	1.406.229.953	3.598.705.452	39,1
M5C2I2.03.01	Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale	216	350.726.616	2.704.006.251	13,0
M5C2I2.01.00	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	194	214.709.157	2.000.000.000	10,7
M5C1I1.01.00	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	146	148.836.099	518.307.308	28,7
M5C2I3.01.00	Progetto Sport e inclusione sociale	105	67.691.614	699.653.816	9,7
M5C1I1.04.00	Sistema duale	226	33.430.800	592.725.057	5,6
M5C2I2.02.03	Piani urbani integrati - progetti generali	38	30.356.147	900.000.000	3,4
.....					
M5 - Inclusione e coesione		3.772	2.319.423.952	13.847.205.381	16,8
M6C1I1.02.01	Casa come primo luogo di cura (Adi)	9	1.400.465.164	2.803.073.407	50,0
M6C2I1.01.01	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	176	356.165.302	2.829.552.905	12,6
M6C1I1.01.00	Case della Comunità e presa in carico della persona	116	198.445.586	1.999.953.093	9,9
M6C1I1.02.03	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	5	131.975.951	998.702.696	13,2
M6C1I1.03.00	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	57	120.046.478	999.996.864	12,0
M6C2I2.01.00	Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	174	47.016.626	522.551.004	9,0
M6C2I1.02.00	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	15	42.507.604	887.394.795	4,8
.....					
M6 - Salute		718	2.377.300.273	14.856.632.053	16,0
M7C1I11.1.00	Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e serv	1	84.500.000	922.509.693	9,2
M7 - RePower EU		1	84.500.000	4.294.419.327	2,0
Totale complessivo		29.297	11.519.113.946	167.506.366.218	6,9

Tavola 9 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per soggetto titolare al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Amministrazione	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termi	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	753.502.228	2.899.467.012	31.864.413.771	2.725.220.250	38.242.603.261	7,1
MINISTERO DELLA SALUTE	427.870.551	3.947.490.856	8.103.970.374	2.377.300.273	14.856.632.053	16,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	381.392.627	6.872.341.085	8.114.389.957	2.051.327.941	17.419.451.609	11,8
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	917.409.835	764.571.534	2.801.365.607	1.637.640.053	6.120.987.029	26,8
MINISTERO DELLA CULTURA	74.134.803	806.789.067	2.203.828.803	891.527.839	3.976.280.511	22,4
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	2.363.174.111	14.520.667.527	7.968.714.482	602.010.154	25.454.566.274	2,4
MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE	2.378.220.254	1.406.459.998	1.979.011.359	600.632.795	6.364.324.406	9,4
MINISTERO DELL'INTERNO	0	933.500.805	2.393.638.871	245.065.304	3.572.204.980	6,9
PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE	109.828.520	2.226.040.382	7.919.052.972	74.947.405	10.329.869.279	0,7
PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT	13.137.177	241.692.264	377.132.761	67.691.614	699.653.816	9,7
PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA	1.098.570	105.829.573	697.404.264	63.719.863	868.052.270	7,3
PCM - DIP. PROTEZIONE CIVILE	6.470.485	677.475.396	434.743.752	43.951.334	1.162.640.968	3,8
MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT	0	761.051.366	90.069.803	42.608.800	893.729.969	4,8
MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	986.580	1.733.432.979	9.338.411.348	35.820.315	11.108.651.222	0,3
PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE	732.439	39.573.774	56.071.129	29.393.502	125.770.844	23,4
MINISTERO DEL TURISMO	3.197.997	345.445.283	1.154.874.789	14.582.000	1.518.100.070	1,0
PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR	12.937.390	75.158.988	101.311.248	5.517.456	194.925.081	2,8
PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE	10.201.681	67.169.195	206.151.550	4.805.587	288.328.013	1,7
MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	0	15.031.321.256	5.785.228.109	2.902.170	20.819.451.535	0,0
PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA	0	4.636.684	1.686.039	2.449.291	8.772.014	27,9
GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAF)	0	41.800.000	0	0	41.800.000	0,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	105.742.565	2.610.046.489	0	2.715.789.054	0,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	0	292.500.000	0	292.500.000	0,0
PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS	0	431.281.960	0	0	431.281.960	0,0
Totale complessivo	7.454.295.248	54.038.939.548	94.494.017.475	11.519.113.946	167.506.366.218	6,9

Tavola 10 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per principali soggetti attuatori al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Soggetto Attuatore	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termi	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER	554.258.583	853.925.078	18.663.428.582	1.949.693.093	22.021.305.336	8,9
REGIONE LOMBARDIA	233.648.650	817.020.595	1.162.061.210	1.114.542.950	3.327.273.406	33,5
REGIONE CAMPANIA	118.808.357	356.938.142	1.488.756.485	1.053.857.323	3.018.360.308	34,9
REGIONE PUGLIA	114.783.744	344.522.811	1.225.252.877	488.728.962	2.173.288.394	22,5
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE SPA	109.616.880	940.006.439	932.755.795	337.038.862	2.319.417.976	14,5
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	70.857.402	406.452.508	295.820.891	324.720.461	1.097.851.263	29,6
REGIONE PIEMONTE	42.791.077	364.188.392	845.870.131	279.266.696	1.532.116.296	18,2
REGIONE CALABRIA	35.834.770	156.718.921	397.402.175	255.820.032	845.775.898	30,2
REGIONE DEL VENETO	3.953.300	427.579.496	854.774.260	177.957.653	1.464.264.708	12,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	7.196.929	11.875.935	50.000.000	174.698.622	243.771.486	71,7
REGIONE ABRUZZO	27.415.271	90.864.339	260.501.482	149.885.350	528.666.442	28,4
ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE	0	0	171.000.000	146.000.000	317.000.000	46,1
REGIONE SICILIANA	340.443.626	685.436.949	744.270.137	132.866.815	1.903.017.527	7,0
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LA DIGITALIZZAZIONE	2.491.309	0	86.067.850	120.000.000	208.559.159	57,5
DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA	0	14.875.349	18.788.669	109.811.680	143.475.697	76,5
REGIONE TOSCANA	17.305.568	416.407.380	624.140.556	106.788.753	1.164.642.256	9,2
REGIONE UMBRIA	718.603	62.350.566	287.733.664	93.337.049	444.139.882	21,0
REGIONE LAZIO	129.118.742	786.772.993	809.307.300	93.166.630	1.818.365.666	5,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	4.830.967	13.955.247.527	570.130.170	82.538.216	14.612.746.879	0,6
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CALABRIA	0	32.861.808	37.816.312	65.489.750	136.167.870	48,1
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.007.418	162.613.251	286.243.184	63.805.658	514.669.511	12,4
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	859.494	81.280.266	80.410.259	63.326.480	225.876.498	28,0
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	9.946.618	165.168.201	527.627.748	62.253.472	764.996.039	8,1
REGIONE LIGURIA	2.423.621	137.839.625	325.833.406	59.764.743	525.861.395	11,4
REGIONE MARCHE	3.747.950	126.010.976	289.081.498	52.329.645	471.170.068	11,1
AUTORITA' D'AMBITO N.3 TORINESE	0	11.680.000	0	50.000.000	61.680.000	81,1
REGIONE MOLISE	8.585.603	30.563.160	146.281.597	47.060.203	232.490.563	20,2
MINISTERO DELLA SALUTE	27.318.595	39.641.998	1.238.215.785	47.016.626	1.352.193.004	3,5
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	0	7.135.500	332.254.484	46.183.754	385.573.737	12,0
SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'EST	0	761.051.366	90.069.803	42.608.800	893.729.969	4,8
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	5.211.299	714.000	28.264.311	37.651.900	71.841.509	52,4
REGIONE BASILICATA	28.634.828	42.695.656	149.339.784	36.124.364	256.794.632	14,1
CONSORZIO DEL PESIO	0	0	0	36.000.000	36.000.000	100,0
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	0	11.489.579	10.186.111	35.124.708	56.800.397	61,8
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	0	2.425.600	6.910.878	31.742.135	41.078.613	77,3
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	0	72.577.325	110.996.077	29.899.346	213.472.748	14,0

Tavola 11 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per Regione (territorio) al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Regione	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termini	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
AMBITO NAZIONALE	612.167.031	28.280.385.705	10.275.224.161	156.965.357	39.324.742.254	0,4
PIEMONTE	214.043.498	1.914.338.430	6.210.762.850	667.074.853	9.006.219.631	7,4
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	27.220.481	80.615.681	419.035.325	38.810.666	565.682.152	6,9
LOMBARDIA	577.861.950	3.965.836.361	9.005.197.261	1.976.038.326	15.524.933.898	12,7
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	42.119.016	569.608.978	1.070.336.825	314.397.604	1.996.462.423	15,7
VENETO	306.300.307	2.362.063.835	7.298.182.734	1.032.388.926	10.998.935.802	9,4
FRIULI-VENEZIA GIULIA	63.798.149	700.999.626	1.264.282.293	177.562.655	2.206.642.724	8,0
LIGURIA	338.646.845	604.705.800	4.182.454.701	162.811.712	5.288.619.058	3,1
EMILIA-ROMAGNA	361.354.477	2.217.619.931	4.963.581.727	782.833.617	8.325.389.752	9,4
TOSCANA	229.607.463	1.664.739.720	3.888.661.632	522.279.255	6.305.288.070	8,3
UMBRIA	63.720.352	440.482.221	1.467.296.121	150.306.499	2.121.805.193	7,1
MARCHE	83.367.095	618.270.924	2.218.945.919	206.109.924	3.126.693.862	6,6
LAZIO	416.803.076	2.369.131.896	8.432.241.820	844.548.837	12.062.725.630	7,0
ABRUZZO	169.759.558	611.364.011	1.898.028.552	351.318.892	3.030.471.013	11,6
MOLISE	87.156.786	198.728.819	1.150.817.100	125.910.170	1.562.612.875	8,1
CAMPANIA	730.356.309	2.234.621.383	8.593.741.275	1.592.007.987	13.150.726.955	12,1
PUGLIA	794.089.599	1.420.951.004	6.390.535.413	853.689.477	9.459.265.493	9,0
BASILICATA	256.272.316	233.162.657	1.466.912.729	114.415.001	2.070.762.704	5,5
CALABRIA	280.920.878	828.861.501	3.909.834.968	599.904.622	5.619.521.970	10,7
SICILIA	1.370.651.933	1.900.190.335	7.573.759.676	543.285.891	11.387.887.835	4,8
SARDEGNA	428.078.128	822.260.727	2.814.184.393	306.453.674	4.370.976.922	7,0
Totale complessivo	7.454.295.248	54.038.939.548	94.494.017.475	11.519.113.946	167.506.366.218	6,9
<i>Totale Regioni</i>	<i>6.842.128.217</i>	<i>25.758.553.843</i>	<i>84.218.793.315</i>	<i>11.362.148.589</i>	<i>128.181.623.964</i>	<i>8,9</i>
<i>Nord</i>	<i>1.931.344.723</i>	<i>12.415.788.643</i>	<i>34.413.833.716</i>	<i>5.151.918.359</i>	<i>53.912.885.441</i>	<i>9,6</i>
<i>Centro</i>	<i>793.497.986</i>	<i>5.092.624.761</i>	<i>16.007.145.491</i>	<i>1.723.244.516</i>	<i>23.616.512.755</i>	<i>7,3</i>
<i>Sud</i>	<i>4.117.285.507</i>	<i>8.250.140.439</i>	<i>33.797.814.107</i>	<i>4.486.985.715</i>	<i>50.652.225.768</i>	<i>8,9</i>

Tavola 12 - Ritardo nell'esecuzione dei progetti per principali Comuni (territorio) al 26 febbraio 2026 (numero, euro, valore percentuale)

Comune	1 - Fase antecedente	2 - Esecuzione termini	3 - Fine successiva	4 - Ritardo esecuzione	Totale complessivo	% Ritardo
ROMA	159.557.464	1.332.136.570	5.263.619.932	414.000.039	7.169.314.005	5,8
LOMBARDIA - TUTTI I COMUNI	165.122.156	311.530.246	2.545.604.630	1.108.865.374	4.131.122.407	26,8
CAMPANIA - TUTTI I COMUNI	43.769.604	471.240.149	2.203.355.801	967.444.727	3.685.810.281	26,2
PIEMONTE - TUTTI I COMUNI	54.393.989	98.766.118	2.756.485.225	237.084.786	3.146.730.118	7,5
MILANO	56.742.935	555.808.703	2.275.504.637	97.376.781	2.985.433.057	3,3
NAPOLI	96.950.484	394.273.498	2.119.752.483	55.442.842	2.666.419.307	2,1
SICILIA - TUTTI I COMUNI	550.565.232	356.565.423	1.662.369.752	73.806.877	2.643.307.283	2,8
LIGURIA - TUTTI I COMUNI	20.171.500	23.987.477	2.270.137.747	67.099.022	2.381.395.747	2,8
PUGLIA - TUTTI I COMUNI	27.417.632	122.085.566	1.967.396.142	109.794.105	2.226.693.445	4,9
VENETO - TUTTI I COMUNI	20.231.500	50.207.677	1.664.863.572	243.777.824	1.979.080.573	12,3
GENOVA	287.142.057	289.357.580	1.147.629.361	20.940.606	1.745.069.604	1,2
TORINO	2.466.662	437.434.337	1.245.703.523	35.785.808	1.721.390.331	2,1
BOLOGNA	4.119.343	196.532.673	1.425.124.222	28.252.608	1.654.028.847	1,7
BARI	38.601.385	196.484.435	993.743.604	93.730.453	1.322.559.877	7,1
TOSCANA - TUTTI I COMUNI	131.690.251	296.042.448	675.976.465	195.559.462	1.299.268.626	15,1
LAZIO - TUTTI I COMUNI	94.247.690	141.392.409	920.727.560	72.755.142	1.229.122.801	5,9
VERONA - TUTTI I COMUNI	220.000	8.669.563	1.189.783.094	18.552.792	1.217.225.449	1,5
VICENZA - TUTTI I COMUNI	0	1.157.686	1.194.777.864	925.820	1.196.861.370	0,1
EMILIA-ROMAGNA - TUTTI I COMUNI	78.759.291	162.868.182	670.122.956	284.693.684	1.196.444.113	23,8
CATANIA	33.703.742	151.144.827	950.689.582	60.065.021	1.195.603.172	5,0
SARDEGNA - TUTTI I COMUNI	122.879.031	154.271.950	876.177.963	8.711.935	1.162.040.878	0,7
CALABRIA - TUTTI I COMUNI	34.446.266	13.921.826	951.973.408	140.518.458	1.140.859.958	12,3
PALERMO	85.375.906	199.576.247	744.957.062	20.539.055	1.050.448.270	2,0
VENEZIA	392.667	188.645.321	424.582.391	416.247.453	1.029.867.832	40,4
PADOVA	729.091	173.171.331	649.192.927	31.347.432	854.440.781	3,7
FIRENZE	1.691.825	257.473.471	510.114.141	30.882.618	800.162.055	3,9
UMBRIA - TUTTI I COMUNI	24.361.583	45.337.978	675.387.957	49.064.953	794.152.471	6,2
BASILICATA - TUTTI I COMUNI	37.657.007	13.008.222	707.364.982	20.812.858	778.843.069	2,7

Tavola 13 - Stato del collaudo dei progetti per fase al 26 febbraio 2026 (euro)

		Completamento				Totale	
		Fase antecedente	Terminato	Successivo	Ritardo		
I n i z i o	Fase antecedente	28.450.722.930	0	0	0	28.450.722.930	17,0
	Iniziato	0	42.898.667.173	23.382.839.010	2.340.530.926	68.622.037.109	41,0
	Successivo	0	0	61.711.806.191	15.092.883	61.726.899.074	36,9
	Ritardo	0	0	6.742.668.173	1.964.038.932	8.706.707.105	5,2
Totale		28.450.722.930	42.898.667.173	91.837.313.374	4.319.662.740	167.506.366.218	
		17,0	25,6	54,8	2,6		

Tavola 14 – Percentuale di pagamento per missione e fase di collaudo al 26 febbraio 2026

Missione	1 - Fase antecedente	2 - Collaudo terminato	3 - Fine successiva	4 - Ritardo collaudo	Totale
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	55,7	98,5	44,0	25,8	71,3
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	19,9	98,2	42,2	43,1	57,7
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	1,1	85,1	51,5	77,3	50,6
M4 - Istruzione e ricerca	39,8	49,3	49,7	46,3	47,8
M5 - Inclusione e coesione	30,4	91,3	45,8	51,3	47,1
M6 - Salute	2,0	77,3	39,8	43,5	46,1
M7 - RePower EU	48,0	60,5	31,1	0,0	44,0
Totale Pnrr	36,6	89,6	46,0	46,9	55,6
